


Uasghrádú Martin Acomhal Nuashonrú ar Dhul Chun Cinn Deireadh Fómhair 2022.

Ba mhaith le Foirgneamh & Innealtóireacht Fox Teo (FBEL) buíochas a ghabháil le cónaitheoirí agus gnólachtaí áitiúla as a bheith foighneach agus muid ag leanúint leis an obair ar thionscadal uasghrádaithe Martin Junction ar son Chomhairle Cathrach na Gaillimhe. Cé go bhfuil dúshlán mhóra romhainn maidir leis an tionscadal seo, táimid ag iarraidh an tionscadal a thabhairt chun críche ar bhealach sábháilte agus tráthúil, ag cinntiú go seachtadair tionscadal ardchaighdeán.

Soláthróidh athsholáthar an timpealláin le hacomhal comharthaíochta timpeallacht níos fearr agus níos sábháilte do choisithe agus do rothaithe, agus áiseanna feabhsaithe iompair phoiblí tríd an acomhal. Nascfaidh sé Ros Cam agus Dabhach Uisce le Clinic na Gaillimhe freisin.

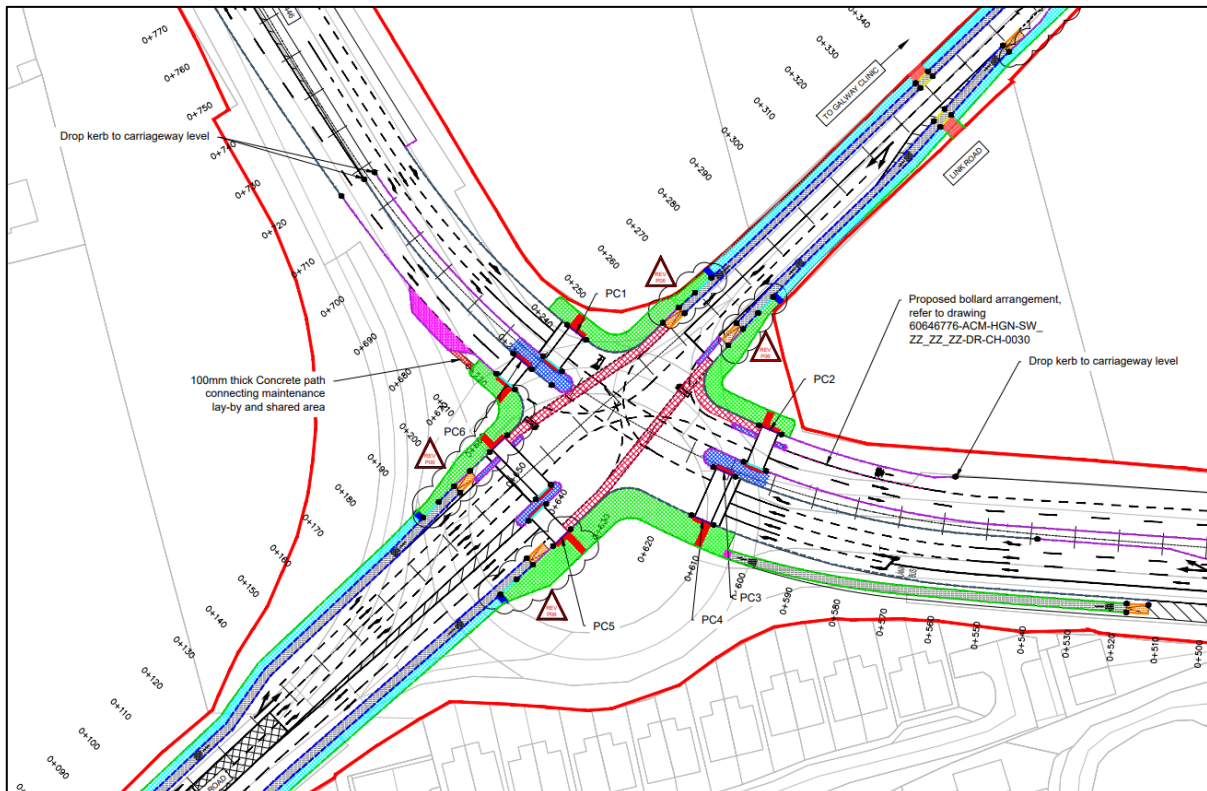

Leagan Amach Beartaithe Acomhal nua Mháirtín

Bhí moill ar an gclár mar thoradh ar cheisteanna éagsúla, lena n-áirítear saincheisteanna slabhra soláthair agus acmhainní ar fud an tionscail, oibreacha breise mar dhraenáil bhreise agus cóireálacha teorann agus dúshlán a bhaineann le carraigeacha ar an láithreán. Bhíothas ag súil le carraig, ach bhí cruas na carraige i bhfad níos mó ná mar a bhíothas ag súil leis agus mar sin tá sé níos moille le briseadh agus le tochair ar an láthair.

Infrastruchtúr trom faoi thalamh den chuid is mó a bhí sna hoibreacha a rinneadh sna míonna tosaigh.

I measc na n-oibreacha tá:


- 1.5km draenála suas go 1800mm trastomhas suiteáilte ag doimhneachtaí suas le 6.5m
- 2.5km+ de dhuchtú fónais/seirbhíse
- Briseadh amach 3000 tonna carraige

- 133m de bhalla coinneála coincréit threisithe feadh na teorann le Durabhán

Déanfar dul chun cinn ar oibreacha leanúnacha le gnéithe os cionn na talún d'uasghrádú an acomhail, ag bogadh ón ailíniú timpeallán atá ann faoi láthair go dtí an leagan amach nua acomhail comharthaíochta 4-lámh. Chun an t-aistriú seo a éascú, leanfar le Bainistíocht Trácht Sealadach suntasach ar an scéim go dtí go mbeidh an tionscadal críochnaithe. Is é Nollaig 2022 an dáta críochnaithe cláraithe.

Tá an clár deartha sna seachtainí amach romhainn ionas go gcuirfear Bainistíocht Trácht Sealadach in ord, chun oibreacha a chur chun cinn ar na ceithre ghéag den acomhal nua atá beartaithe. Áirítear ar na hoibreacha atá le teacht:

- Kerbing
- Bonneagar comharthaí trácht agus tástáil
- Colúin soilsithe poiblí
- Cosáin agus lánaí rothar
- Fálú
- Cosán bóthair nua
- Tírdhreachú.

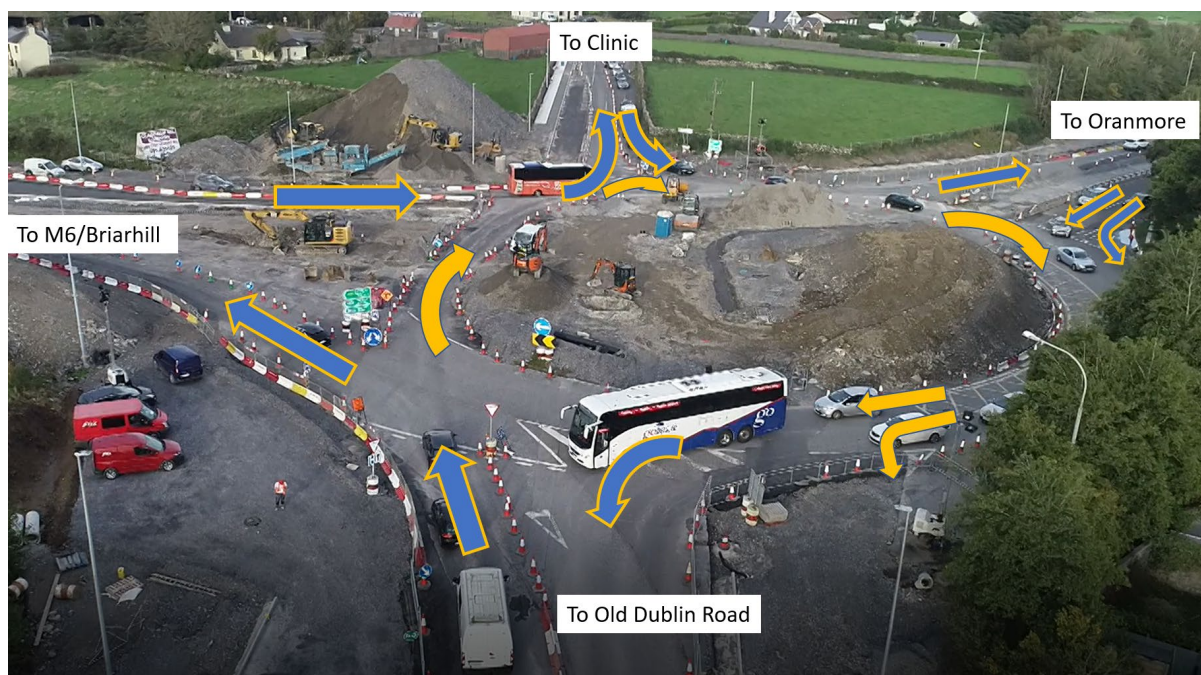

Leagan Amach Reatha um Bainistíocht Trácht

De réir mar a théann gach céim ar aghaidh, táthar ag súil le hathruithe ar leagan amach an bhóthair. Oibreoidh Fox Building & Engineering Ltd chun sreafaí trácht tríd an acomhal a bharrfheabhsú chun moilleanna a íoslaghdú, agus gluaiseacht shábháilte a choinneáil trí na hoibreacha don phobal taistil, agus chun sábháilteacht ár bhfoireann tógála atá ag obair ar an tionscadal a chinntiú.

Má tá aon cheist agat déan teagmháil le do thoil le hOifigeach Idirchaidrimh Fox Building & Engineering Ltd ag baint úsáide as an uimhir thíos:

- Oifigeach Idirchaidrimh (Conán Brady) contact: **087 709 4491**

Le haghaidh nuashonruithe breise ar an tionscadal seo féach le do thoil ar

www.galwaycity.ie/martinjunction

Mise le mórmheas,

Foirgneamh agus Innealtóireacht Fox Teo.
